


**APQ TUTELA DELLE ACQUE E GESTIONE INTEGRATA DELLE RISORSE IDRICHE**  
**IV ATTO INTEGRATIVO**  
(dati al 30.06.2009)


<b>Codice</b>	RL	
<b>Data di stipula</b>	29/05/2007	
<b>Soggetti sottoscrittori</b>	MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E IL MARE MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI REGIONE PIEMONTE	
<b>Direzione regionale</b>	Ambiente	
<b>Responsabile Accordo</b>	Salvatore De Giorgio	
<b>Numero Interventi</b>	31 (attivi=29, sospesi=2)	
<b>Risorse Finanziarie (mil di euro)</b>	<b>Valore Totale APQ</b>	<b>112,7</b>
	Risorse statali (ordinarie+FAS)	50,3
	Risorse regionali	0,6
	Enti locali	0,7
	Altri finanziamenti (pubblici)	61,1
<b>Obiettivi e tipologia intervento</b>	Ampliare il quadro degli interventi previsti nel Piano di tutela delle acque, in linea con gli obiettivi già delineati nei precedenti APQ, per il ripristino della qualità dei corpi idrici superficiali e sotterranei, per il soddisfacimento dei fabbisogni idrici e di risoluzioni di situazioni locali di crisi idrica, adeguare e potenziare gli impianti esistenti. Progettazione e realizzazione di interventi di: razionalizzazione di sistemi di collettamento e depurazione dei reflui urbani; potenziamento e adeguamento di impianti di depurazione; realizzazione e adeguamento di collettori di collegamento; adeguamento del sistema acquedottistico esistente.	
<b>Attuazione</b>	L'APQ stipulato nel 2007, in attuazione della delibera CIPE n. 3/2006, aveva un valore di circa 44 milioni di euro; al 30 giugno 2009 il valore dell'APQ è pari a 86 milioni di euro dovuti principalmente alla riprogrammazione di economie di precedenti accordi. Gli interventi inseriti nell'APQ sono principalmente di realizzazione degli interventi la cui progettazione era stata finanziata nell'accordo del 2006. Circa il 63% degli interventi sono in corso di attuazione.	

**RL - Dimensione finanziaria degli interventi**




■ < 1M€ ■ tra 1 e 2,5M€ ■ tra 2,5 e 5 M€ ■ tra 5 e 10 ■ > 10 M€

**RL- Stato di avanzamento: costo realizzato**



■ Costo da realizzare ■ Costo realizzato

**RL - Stato di avanzamento procedurale**

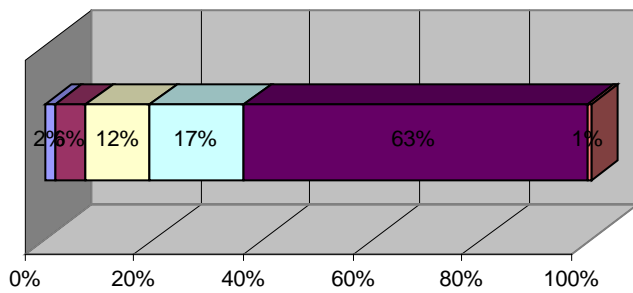

■ Studio fattibilità - Prelim.re ■ Definitiva  
■ Esecutiva ■ Agg.ne lavori  
■ Lavori in corso ■ Lavori conclusi
